



12月12日

外壁その他

高圧洗浄作業

施工中

12月11日

足場組立作業

12月12日

メッシュシート施工



12月12日

外壁その他

高圧洗浄作業

施工中



12月12日

外壁その他

高圧洗浄作業

施工中



12月12日

外壁その他

高圧洗浄作業

施工中

北面、軒樋

施工前



12月12日

外壁その他

高圧洗浄作業

施工中



12月12日

外壁その他

高圧洗浄作業

施工中



材料

雨樋、シャッターボックス

破風板、金属部分など

上塗り塗料（2回塗り）

エスケー化研

グリーンマイルドフッソ

SR-103 つや有り

12月13日

雨樋

上塗り 1回目

施工中



材料

鉄部

下塗り塗料（さび止め）

エスケー化研

エポさびα

白色





12月13日

シャッターボックス

下塗り

施工中



12月13日

シャッターボックス

下塗り

施工後



12月13日

窓まわり、雨樋など

養生作業

施工後



12月14日

シャッターボックス、

付帯部分、 金属部分

上塗り 1回目

施工中



12月14日

シャッターボックス、

付帯部分、 金属部分

上塗り 1回目

施工中



12月14日

シャッターボックス、

付帯部分、 金属部分

上塗り 1回目

施工中



12月14日

シャッターボックス、

付帯部分、 金属部分

上塗り 1回目

施工中



12月14日

シャッターボックス、

付帯部分、 金属部分

上塗り 1回目

施工中



12月14日

シャッターボックス、

付帯部分、 金属部分

上塗り 1回目

施工中



材料

軒裏

目地ひび割れ部分

下地調整用

IPペイント

IPパテ 万能（内外部用）



12月16日

軒裏

目地ひび割れ部分

下地調整

施工中



12月16日

軒裏

目地ひび割れ部分

下地調整

施工中



材料

シリコンコーキング

接着用塗料

信越化学工業

ペインター20




12月16日

シリコンコーキング

接着用塗料

施工中

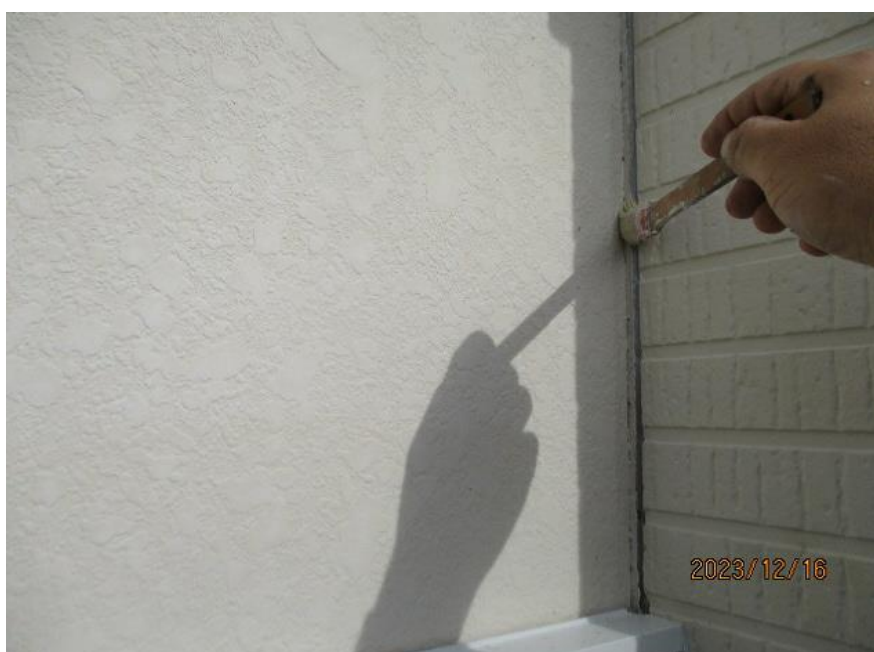

12月16日

シリコンコーキング

接着用塗料

施工中



12月16日

鳥の巣あり

穴埋め

施工前



12月16日

屋根瓦

ひび割れ

コーキング補修

施工前



12月16日

屋根瓦

ひび割れ

コーキング補修

施工後



12月16日

窓まわりほか

養生作業

施工後



12月16日

窓まわりほか

養生作業

施工後



12月16日

窓まわりほか

養生作業

施工後



材料


軒裏

上塗り塗料（2回塗り）

エスケー化研

セラミタウンマイルド

つや消し白

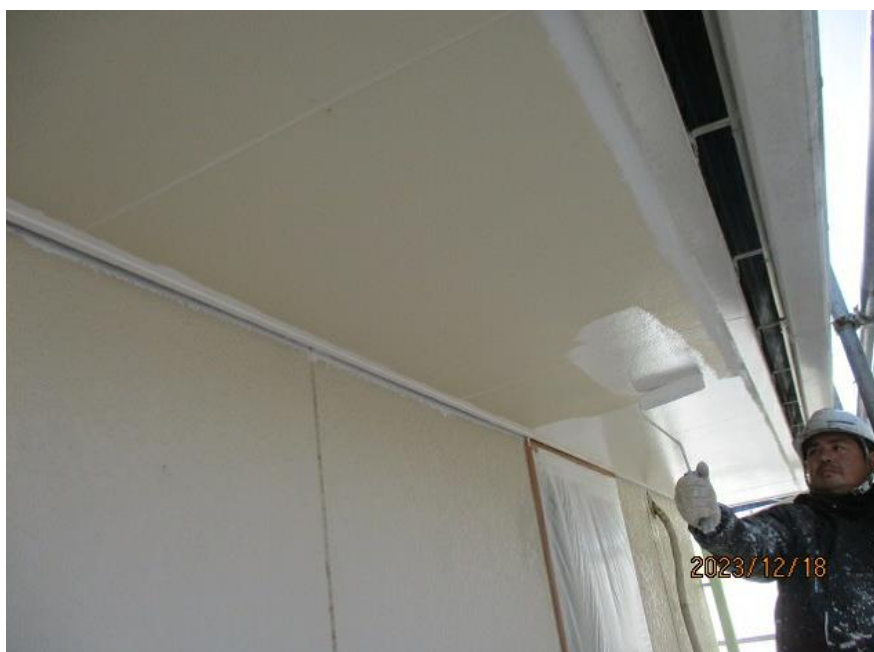

12月18日

軒裏

下塗り

施工中



12月18日

軒裏

上塗り

施工中



12月 1 8 日

屋根瓦

漆喰

点検



12月 1 8 日

屋根瓦

漆喰

点検



12月 1 8 日

軒樋（北面）

水洗い

施工後



材料

外壁

下塗り塗料

アステックペイント

エポパワーシーラー

クリアー色



材料

外壁

上塗り塗料

アステックペイント

フッ素REVO1000IR

9003ホワイトリリイ

3分つや有り



12月18日

外壁

下塗り

施工中



12月19日

外壁

下塗り

施工中



12月19日

破風板

上塗り 1回目

施工中



12月19日

軒樋

上塗り 1回目

施工中



材料

上塗り 1 回目

調色用ペイント

横浜化成

水性コンク

ブラック色



12月19日

外壁

上塗り 1 回目

施工中



12月20日

外壁

上塗り 2 回目

施工中



12月20日

外壁

上塗り1回目

施工中



12月20日

外壁

上塗り 1 回目

施工中

(はけ塗り作業)



12月20日

外壁

上塗り 1 回目

施工中

(はけ塗り作業)



12月20日

軒裏

上塗り 2回目

施工中



12月20日

破風板

上塗り 2回目

施工中



12月20日

軒樋

上塗り 2回目

施工中



12月21日

外壁

上塗り 2回目

施工中



12月21日

外壁

上塗り 2回目

施工中



12月21日

ボーダー

上塗り 2回目

施工中



12月21日

シャッターボックス

上塗り2回目

施工中



12月21日

鳥の巣

穴うめ

施工前



12月21日

鳥の巣

穴うめ

施工後



12月21日

鳥の巣

穴うめ

施工前



12月21日

鳥の巣

穴うめ

施工後



12月22日

鉄部

上塗り 2回目

施工中



12月22日

ボーダー

上塗り3回目

施工中




12月22日

シャッターボックス

上塗り2回目

施工中

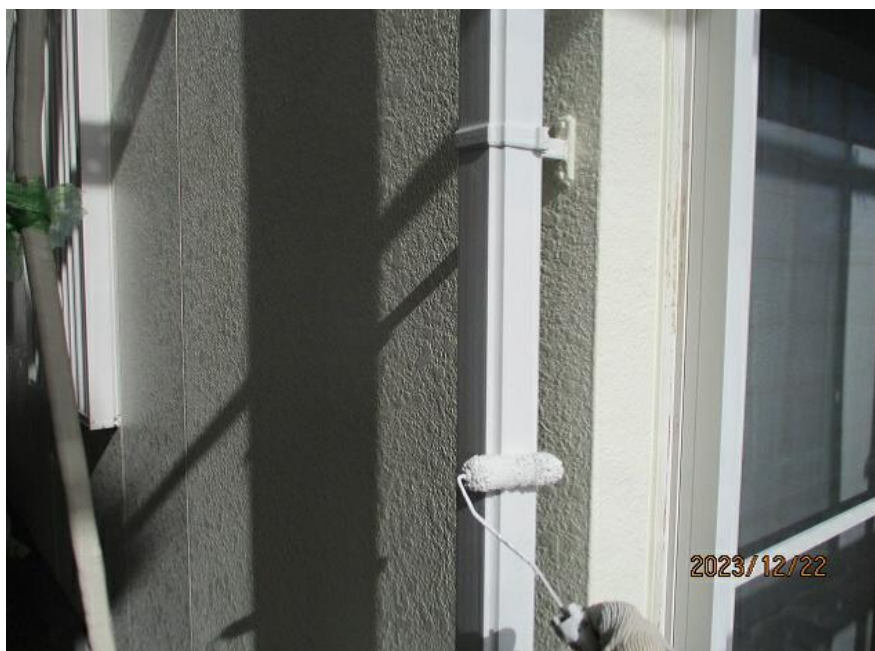

12月22日

縦樋

上塗り2回目

施工中



12月22日

窓まわりなど

清掃作業

施工中



12月22日

窓まわりなど

補修塗装

施工中



12月22日

エアコンパイプ

テープ巻き

施工中
